ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ
АШАНИН

ТЕХНИЧКИИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИПРОЈЕКТАГЕОДЕТСКОГ ОСМАТРАЊА СЛЕГАЊА ТЛА ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД – СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) СТАЦИОНАЖА ОД КМ 134+875 ДО 135+250

Прва епоха

Деловодни број: Н.134+875 – 135+250-1

Ревизија: 00

Датум: Децембар 2024.

Инвеститор:	„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Немањина 6/4, Београд
Пројектант:	„Shandong Luqiao group CO. LTD ogranak Beograd” Трг пријатељства Србије и Кине 4, Нови Београд
Консултант:	Бојан Ашанин пр Геодетске услуге Ашанин Панчево ул. Војвођански булевар 32/38, Панчево
Објекат:	Пруга Београд – Суботица државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД – СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
Локација објекта:	Нови Сад - Суботица, Србија
Задатак:	Технички извештај о реализацији пројекта геодетског осматрања слегања тла
Одговорни извођач:	Драгомир Стојићевић, дипл. геод. инж.
Датум израде:	Децембар 2024.
Ревизија	00

Одговорни извођач:

Драгомир Стојићевић, дипл. геод. инж.

За Геодетске услуге Ашанин

Бојан Ашанин, директор

САДРЖАЈ

Општа документација....4

ТЕХНИЧКИ ДЕО....5

1. Увод....5

2. Теренска мерења и обрада резултата мерења....5

2.1. Реализована мерења у контролној 1Д мрежи....5

2.2. Анализа грешака мерења....7

2.3. Избор методе мерења....8

2.4. Изравање резултата мерења и деформациона анализа у контролној 1Д мрежи....10

3. Садржина елабората геодетских радова....11

4. Закључак....12

5. Нумеричка документација....13

6. Графичка документација....16

Општа документација

5000217676451

ИЗВОД О РЕГИСТРОВАНИМ ПОДАЦИМА ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

Република Србија
Агенција за привредне регистре

ОСНОВНИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТАК	
Регистарски/Матични број:	66185222
СТАТУСИ	
Статус предузетника:	Активан
Са статусом социјалног предузетништва:	Не
ЛИЧНИ ПОДАЦИ ПРЕДУЗЕТНИКА:	
Име и презиме	Бојан АшанинПол: Мушки
ЈМБГ	2908988860025
ПОДАЦИ О ПОСЛОВНОМ ИМЕНУ	
Пословно име:	Бојан Ашанин пр Геодетске услуге Ашанин Панчево
ПОДАЦИ О АДРЕСАМА	
Адреса седишта	
Општина:	ПАНЧЕВО
Место:	ПАНЧЕВО
Број и назив поште:	26000 ПАНЧЕВО
Улица, број и слово, спрат, број стана и слово:	ВОЈВОЂАНСКИ БУЛЕВАР 32, стан 38
Адреса за пријем електронске поште	
Е-пошта:	bojan.ashanin@gmail.com
ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ	
Подаци оснивања	
Почетак обављања делатности:	30.06.2021
Време трајања	
Предузетник је регистрован на:	неодређено време
Претежна делатност	
7112	Инжењерске делатности и техничко саветовање
Остали идентификациони подаци	
Регистарски/Матични број:	66185222
ПИБ:	112555718
Подаци од значаја за правни промет	
Бројеви рачуна у банкама:	325-9500700188095-62 и 325-9601700059770-24

Регистратор: Милашин Маглов

Дана 03.08.2023. године у 13:36:43 часова

Република Србија
Агенција за привредне регистре

5000189000018

Регистар привредних субјеката

БП 67528/2021
Датум, 30.06.2021. године
Београд

Регистратор Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, („Службени гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014 и 31/2019), одлучујући о јединственој регистрационој пријави оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника, коју је поднео:

Име и презиме: Бојан Ашанин

доноси

РЕШЕЊЕ

Усваја се јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника, па се у Регистар привредних субјеката региструје:

Bojan Ašanin pr Geodetske usluge Ašanin Pančevo

са следећим подацима:

Лични подаци предузетника:

Име и презиме: Бојан Ашанин
ЈМБГ: 2908988860025

Пословно име предузетника:

Bojan Ašanin pr Geodetske usluge Ašanin Pančevo

Пословно седиште: ВОЈВОЂАНСКИ БУЛЕВАР 32, стан 38, ПАНЧЕВО, Србија
Број и назив поште: 26000 ПАНЧЕВО
Регистарски број/Матични број: **66185222**

ПИБ додељен од Пореске Управе РС: **112555718**

Почетак обављања делатности: 30.06.2021 године
Претежна делатност: **7112 -** Инжењерске делатности и техничко саветовање

Предузетник се региструје на: неодређено време

Адреса за пријем електронске поште: bojan.ashanin@gmail.com

Образложење

Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 25.06.2021. године јединствену регистрациону пријаву оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника број БП 67528/2021, за регистрацију:

Bojan Ašanin pr Geodetske usluge Ašanin Pančevo

Проверавајући испуњеност услова за регистрацију, прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у дипозитиву решења, у складу са одредбом члана 16. Закона.

Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС", бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016, 75/2018, 73/2019, 15/2020, 91/2020 и 11/2021).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 30 дана од дана објављивања одлуке на интернет страни Агенције за привредне регистре, министру надлежном за послове привреде, а преко Агенције за привредне регистре. Административна такса за жалбу у износу од 480,00 динара и решење по жалби у износу од 550,00 динара, уплаћује се у буџет Републике Србије. Жалба се може изјавити и усмено на записник у Агенцији за привредне регистре.

РЕГИСТРАТОР

Миладин Маглов

ОБАВЕШТЕЊЕ:

У прилогу овог решења налази се потврда о додели пореског идентификационог броја (ПИБ) и потврда о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање.

Ако се у прилогу решења не налазе наведене потврде у обавези сте да урадите следеће:

1. Да се обратите Пореској управи ради доделе ПИБ-а,
2. Да лично поднесете јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање, **ОДМАХ** по пријему овог обавештења И САМО УКОЛИКО СТЕ ПРИЈАВИЛИ ПОЧЕТАК ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ, на једном од шалтера било које организационе јединице организације за обавезно социјално осигурање (Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Републички завод за здравствено осигурање, Национална служба за запошљавање) или преко портала Централног регистра обавезног социјалног осигурања (http://www.croso.rs/), уколико већ нисте пријављени на осигурање по основу радног односа код другог послодавца. и то само уколико сте пријавили почетак обављања делатности.

Напомена: Од 1. октобра 2018. привредни субјекти немају обавезу да употребљавају печат у пословним писмима и другим документима

Република Србија
Агенција за привредне регистре

5000189241794

Регистар привредних субјеката
БП 71179/2021

Дана, 06.07.2021. године
Београд

Регистратор Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014, 31/2019), одлучујући о регистрационој пријави промене података код Bojan Ašanin pr Geodetske usluge Ašanin Pančevo, са матичним/регистарским бројем: 66185222, коју је поднео/ла:

Име и презиме: Бојан Ашанин

доноси

РЕШЕЊЕ

УСВАЈА СЕ регистрациона пријава, па се у Регистар привредних субјеката, региструје промена података код:

Bojan Ašanin pr Geodetske usluge Ašanin Pančevo

Регистарски/матични број: **66185222**

и то следећа промена:

- **Промена података о пословном имену:**

  Брише се:

  Bojan Ašanin pr Geodetske usluge Ašanin Pančevo

  Уписује се:

  Бојан Ашанин пр Геодетске услуге Ашанин Панчево

Образложење

Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 02.07.2021. године регистрациону пријаву промене података број БП 71179/2021 и уз пријаву је доставио документацију наведену у потврди о примљеној регистрационој пријави.

Проверавајући испуњеност услова за регистрацију промене података, прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, Регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у диспозитиву решења, у складу са одредбом члана 16. Закона.

Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС”, бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016, 75/2018, 73/2019, 15/2020, 91/2020 и 11/2021).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 30 дана од дана објављивања одлуке на интернет страни Агенције за привредне регистре, министру надлежном за послове привреде, а преко Агенције за привредне регистре. Административна такса за жалбу у износу од 480,00 динара и решење по жалби у износу од 550,00 динара, уплаћује се у буџет Републике Србије. Жалба се може изјавити и усмено на записник у Агенцији за привредне регистре.

РЕГИСТРАТОР

Миладин Маглов

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

број 952-03-259/2021

Дана: 10.09.2021. године

Београд

Републички геодетски завод, решавајући по захтеву Бојан Ашанин пр Геодетске услуге Ашанин Панчево, Војвођански Булевар 32 стан 38, ПАНЧЕВО, за издавање лиценце за рад, на основу члана 13. став 2. Закона о државном премеру и катастру («Службени гласник РС», број 72/09, 18/10, 65/13, 15/15, 96/15, 47/17, 113/17, 27/18, 41/18 и 9/20) и члана 136. Закона о општем управном поступку («Службени гласник РС», број 18/2016 и 95/18), доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

ИЗДАЈЕ СЕ лиценца за рад геодетској организацији Бојан Ашанин пр Геодетске услуге Ашанин Панчево, (МБ 66185222) и то за:

- израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта

- извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова

- израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат

- израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања

- реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања

Крстић Милица, дипломираном инжењеру геодезије, и имаоцу геодетске лиценце првог реда, Ашанин Бојан, мастер инжењеру геодезије, запосленима у геодетској организацији Бојан Ашанин пр Геодетске услуге Ашанин Панчевоиздају се легитимације за идентификацију.

Одштампани примерак оригиналног електронског документа

О б р а з л о ж е њ е

Геодетска организација Бојан Ашанин пр Геодетске услуге Ашанин Панчево, поднела је Републичком геодетском заводу захтев за издавање лиценце за рад.

Уз захтев је достављена следећа документација:

- решење о упису геодетске организације у регистар агенције за привредне регистре

- попуњен образац запослени (прилог 2)

- доказ о стручној спреми за лица геодетске струке без геодетске лиценце и лица пољопривредне струке

- потврду о поднетој пријава на обавезно социјално осигурање за сваког запосленог геодетске и пољопривредне струке

- штампани податак из читача електронске личне карте, односно фотокопију личне карте за коју није могуће одштампати податке користећи читач личних карата, за сваког запосленог геодетске и пољопривредне струке

- две фотографије димензија 30 x 35 mm за сваког запосленог геодетске и пољопривредне струке, за потребе издавања легитимације за идентификацију

- попуњен образац геодетски инструменти (прилог 3)

- доказ о поседовању геодетских инструмената (минимум један) којима геодетска организација обезбеђује хоризонтално и вертикално позиционирање тачака у државном референтном систему

- документ о исправности геодетских инструмената из тачке 12) овог става, који не сме бити старији од две године

- за Крстић Милица, достављена је диплома Грађевинског факултета Универзитета у Београду, копија геодетске лиценце првог реда, потврда о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање и очитана лична карта.

- за Ашанин Бојан, достављена је диплома Грађевинског факултета Универзитета у Београду, потврда о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање и очитана лична карта.

Ценећи достављене исправе, Републички геодетски завод је утврдио да геодетска организација испуњава услове из члана 17. став 1., 3., 4. и 5. Закона о државном премеру и катастру («Службени гласник РС», бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15, 96/15, 47/17, 113/17, 27/18, 41/18 и 9/20), па је одлучено као у ставу 1. диспозитива овог решења.

Обзиром да је одредбама члана 16. став 1. наведеног закона прописано да лицу геодетске струке запосленом у геодетској организацији, Завод издаје легитимацију за идентификацију, одлучено је као у ставу 2. диспозитива овог решења.

Наплаћена је административна такса у износу од 330,00 динара, сходно тарифном бр. 1. Закона о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", бр. 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19 , 98/20, 144/2020 и 62/2021), такса за издавање лиценце за рад у износу од 9.050,00 динара и такса за издавање легитимација за запослене у износу од 2.940,00 динара, сходно тарифном броју 215љ Закона о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", бр. 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19 , 98/20, 144/2020 и 62/2021).

Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у року од 8 дана од дана пријема решења, а преко Републичког геодетског завода у Београду, Булевар војводе Мишића бр. 39, са доказом о плаћеној републичкој административној такси у износу од 490,00 динара сходно тарифном бр. 6 горе поменутог Закона, на жиро-рачун пореске управе Београд број 840-742221843-57 са позивом на број 7801640600.

ИВАНА ЖИВАНОВИЋ 011227901 Sign

Digitally signed by ИВАНА ЖИВАНОВИЋ 011227901 Sign
DN: c=RS, serialNumber=PNORS-2207987715295, serialNumber=CA:RS-011227901, sn=ЖИВАНОВИЋ, givenName=ИВАНА, cn=ИВАНА ЖИВАНОВИЋ 011227901 Sign
Date: 2021.09.10 13:18:26 +02'00'

Припремила: Ивана Живановић, дипл.правник

Парафирала: Александра Николић, дипл.геод.инж.

В.Д. ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА

Aleksandra Nikolic
10.09.2021 14:31:46

Saša Đurović
13.9.2021 8:04:42

Саша Ђуровић, дипл.геод.инж.

Доставити:

- Бојан Ашанин пр Геодетске услуге Ашанин Панчево, Војвођански Булевар 32 стан 38, ПАНЧЕВО (bojan.ashanin@gmail.com)

- СКН Панчево, skn.pancevo@rgz.gov.rs

- Архиви

Одштампани примерак оригиналног електронског документа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

ГЕОДЕТСКА ЛИЦЕНЦА

првог реда

Решењем Републичког геодетског завода

број 952-03-312/2019 од 19. новембра 2019. године

утврђено је да је

Милица Д. Крстић

Дипломирани инжењер геодезије

ЈМБГ 1806955715495

ималац геодетске лиценце првог реда

Број

01 0621 19

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД

ДИРЕКТОР

Мр Борко Драшковић, дипл. геод. инж.

У Београду,

19. Новембар 2019. године

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ЛИЦЕНЦА

ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

На основу Закона о планирању и изградњи и
Статута Инжењерске коморе Србије

УПРАВНИ ОДБОР ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
утврђује да је

Драгомир А. Стојићевић

дипломирани инжењер геодезије
ЛИБ 05049066171

одговорни извођач радова

геодетских радова

Број лиценце
471 J292 15

ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ

Проф. др Милисав Дамњановић
дипл. инж. арх.

У Београду,
4. јуна 2015. године

Број: 02-12/2024-12416
Београд, 29.05.2024. године

На основу члана 14. Статута Инжењерске коморе Србије ("СГ РС", бр. 36/19), а на лични захтев члана Коморе, Инжењерска комора Србије издаје

П О Т В Р Д У

Којом се потврђује да је Драгомир А. Стојићевић, дипл. инж. геод.
лиценца број

372 О157 15

Одговорни пројектант геодетских пројеката

на дан издавања ове потврде члан Инжењерске коморе Србије, да је измирио обавезу плаћања чланарине Комори за текућу годину, односно до 10.04.2025. године, као и да му није изречена мера пред Судом части Инжењерске коморе Србије

М.П.

Председник Управног одбора
Инжењерске коморе Србије

Михајло Мишић, дипл. грађ. инж.

Број: 02-12/2024-12417
Београд, 29.05.2024. године

На основу члана 14. Статута Инжењерске коморе Србије ("СГ РС", бр. 36/19), а на лични захтев члана Коморе, Инжењерска комора Србије издаје

П О Т В Р Д У

Којом се потврђује да је Драгомир А. Стојићевић, дипл. инж. геод.
лиценца број

471 J292 15

Одговорни извођач геодетских радова

на дан издавања ове потврде члан Инжењерске коморе Србије, да је измирио обавезу плаћања чланарине Комори за текућу годину, односно до 10.04.2025. године, као и да му није изречена мера пред Судом части Инжењерске коморе Србије

М.П.

Председник Управног одбора
Инжењерске коморе Србије

Михајло Мишић, дипл. грађ. инж.

UDRUŽENJE TRANSVERZALA BEOGRAD

Omladinskih brigada 7đ
11070 Novi Beograd
Srbija
e-mail: transverzala.rs@gmail.com
www.transverzala.rs

АТС
02-077
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕТАЛОНИРАЊЕ
ISO/IEC 17025

UVERENJE O ETALONIRANJU

Broj predmeta: 230175/2
Datum: 15.11.2023.

Ukupan broj strana: 1

Vrsta merila:	Nivelir
Vlasnik/korisnik merila:	Bojan Ašanin pr Geodetske usluge Ašanin Pančevo, Vojvođanski bulevar 32/38, Pančevo
Datum etaloniranja:	15.11.2023.
Proizvođač i tip merila:	LEICA, DNA03
Serijski broj/ Inv. broj:	347072
Metrološke karakteristike:	- merni opseg - uglovi: α = 0° - granica greške: ± 0,3 mm/km (sa invarskim barkod letvama)
Mesto etaloniranja	Omladinskih brigada 7đ, Novi Beograd
Metode etaloniranja:	- SRPS/ISO 17123-2:2014
Sledljivost:	- frekvencijski stabilisani helijum-neonski (He-Ne) laser preko DMDM, (nacionalni etalon dužine)
Rezultati etaloniranja:	- ugao "*i*": 0"
Merna nesigurnost:	- proširena merna nesigurnost merenja visinskih razlika između repera (faktor proširenja k=2): U_{1km}= 0,31 mm/km. *Merna nesigurnost iskazana u ovom Uverenju data je kao proširena merna nesigurnost, gde je standardna merna nesigurnost pomnožena faktorom proširenja k=2, koji za normalnu raspodelu odgovara verovatnoći obuhvata približno 95% (EA-4/02 M).*

METROLOG
Dr Siniša Delčev, dipl. geod. inž.

M.P.

Za, TEHNIČKI RUKOVODILAC LABORATORIJE
Dr Jelena Gučević, dipl. geod. inž.

Uverenje o etaloniranju bez pečata i potpisa nije važeće. Ovo uverenje se ne sme reprodukovati, sem u celini, bez odobrenja laboratorije i korisnika. Rezultati merenja odnose se samo na etalonirane predmete.
Kraj uverenja o etaloniranju.

ТЕХНИЧКИ ДЕО

1. Увод

Пројекат реализације геодетског осматрања слегања тла пројекта реконструкције, модернизације и изградње пруге Београд – Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), за брзину до 200 km/h, на стационажи од km 134+875 до km 135+250 израђује се у циљу откривања евентуалних величина слегања које се морају открити, а које су дефинисане условима тачности у пројектном задатку.

2. Теренска мерења и обрада резултата мерења

2.1. Реализована мерења у контролној 1Д мрежи

На основу дефинисаног пројекта, а ради вертикалног праћења слегања тла извршено је геодетско мерење прве епохе. Мерење је реализовано у Децембру 2024. године. План мерења, оргиналне резултате мерења као и резултате изравнања мреже приказани су у нумеричком и графичком прилогу.

Тачност мерења (априорни дисперзиони фактор) усвојен је на основу искуствено познате границе тачности инструмената који су на располагању (Leica DNA03) и на основу критеријума задатих пројектним задатком, и износи σ_0= 1 mm. Тачност мерења односи се на тачност елементарне висинске разлике у мрежи, односно на висинску разлику одређену на једној станици.

<u>У циљу добијања захтеваних мера квалитета, мрежа је дефинисана:</u>

- Усвојеним планом мерења и пројектованом геометријом из пројекта геодетског осматрања 1D мреже;
- Усвојеном тачношћу мерења висинских разлика: $\sigma^2{}_h = \sigma^2{}_0 n_i$; где су: n_i- број станица у влаку; а априори дисперзиони стандард σ_0= 1 mm;
- Тежинама мерења висинских разлика: $p_i = \frac{\sigma_0^2}{\sigma_h^2} = \frac{\sigma_0^2}{\sigma_0^2 \cdot n_i} = \frac{1}{n_i}$;
- Број мерених величина је n=64;
- Број непознатих параметара је u=40;
- σ_0= 1 mm.
- Датум је дефинисан минималним трагом на свим тачкама.

Висинске разлике које су изнивелане дате су у табели.

1	2	0.7381	27
2	3	-0.757	27
3	4	0.033	27
4	5	0.7089	25
5	6	-0.5321	25
6	1	-0.1904	27
1	6	0.1904	27
6	7	-0.1723	27
7	8	0.6685	25
8	9	-0.6146	25
9	4	-0.0581	27
4	9	0.0581	27
9	10	-0.2024	27
10	11	0.8073	24
11	12	-0.759	24
12	7	0.1001	27
7	12	-0.1002	27
12	13	0.046	27
13	14	0.6867	25
14	15	-0.56	25
15	10	-0.2211	27
10	15	0.2212	27
15	16	-0.1274	27
16	17	0.6943	23
17	18	-0.7208	23
18	13	0.0272	27
13	18	-0.0271	27
18	19	-0.0013	28
19	20	0.7404	27
20	21	-0.5939	26
21	16	-0.1185	27
16	21	0.1186	27
21	22	-0.2975	27
22	23	0.8905	25
23	24	-0.6969	25
24	19	-0.0421	27
19	24	0.0419	27
24	25	0.034	27
25	26	0.718	26
26	27	-0.8075	26
27	22	-0.1381	27
22	27	0.138	27

27	28	-0.047	27
28	29	0.7924	25
29	30	-0.7814	25
30	25	0.1253	27
25	30	-0.1256	27
30	31	-0.0039	27
31	32	0.7734	24
32	33	-0.701	24
33	28	-0.0791	27
28	33	0.0791	27
33	34	0.1333	100
34	35	0.6543	29
35	36	-0.6309	28
36	37	-0.0196	27
37	38	0.5921	24
38	39	-0.634	24
39	34	0.0385	27
34	39	-0.0385	27
39	GMP448N	0.0529	18
GMP448N	36	0.0071	20
36	31	-0.2294	100
7	GMO024	-0.9244	72

2.2. Анализа грешака мерења

Да би резултати извршених мерења задовољили пројектом захтевану тачност дозвољено је да за вероватноћу од 95% буде:

- Дозвољена разлика вредности висинских разлика на једној станици из два положаја инструмента $\Delta \leq 2m_0\sqrt{2}=0.51mm$
- Дозвољено незатварање полигона $\Delta_p \leq 2m_0\sqrt{n}=0.36\sqrt{n}$, где је n-укупан број станица у полигону у једном положају инструмента.

Да би постигли задату тачност посвећена је пажња на следеће изворе грешака.

Извор грешака	**Поступак елиминације**
1. Тачност инструмента	Коришћен инструмент *Leica DNA03* .
2. Грешка поделе летве	Тежило се да буде паран број станица између два репера. Коришћене инварске летве.
3. Нехоризонталност визуре	Пре почетка мерења испитан инструмент. Тежило се да нивелање буде из средине (што је било тешко изводити ради низа фактора који прате текуће грађевинске радове)
4. Стабилност статива	Коришћен стабилни дрвени статив, бирати стабилну подлогу за место станице.
5. Невертикалност летве	Коришћена адекватна либела на летвама. Осетљивост либеле на коришћеној инварској летви је: $\alpha = 12'$
6. Треперење ваздуха	Нивелано у повољним временским условима
7. Ветар	Коришћене значке за стабилизацију летви

2.3. Избор методе мерења

Мерења у 1Д контролној мрежи, реализована су методом геометријског нивелмана. Приликом мерења је коришћен инструмент декларисане тачности од 0.3 mm/km. Због неопходне ефикасности коришћен је дигитални нивелир са инварским бар-код летвама одговарајуће тачности. Пре почетка мерења испитана је исправност инструмента.

Реализација мерења почела је након констатације извођача радова да су испуњени сви услови.

Приликом мерења придржавали смо се следећих услова тачности:

- Приликом мерења **тежили** смо да се инструмент налази на једнакој удаљености од обе летве;
- Мерења су реализовани само у периоду мирних и јасних ликова;
- Мерења изведена по затвореним полигонима датим у графичком Прилогу са скицама мрежа;
- Контролисана мерења према критеријумима за праћење и контролу мерења;
- Дужина визуре није била већа од 50m;
- Тежили смо да летву не читамо ниже од 0.5m у односу на терен;

Инструмент и прибор за мерење:

ОПРЕМА	КОМАДА
НИВЕЛИР (ПРЕЦИЗНОСТ $0.3mm/km$)	1
ПРЕЦИЗНЕ НИВЕЛМАНСКЕ ЛЕТВЕ	2
ДРЖАЧИ ЗА ЛЕТВЕ	2
ПАПУЧЕ	2

Једну геодетску теренску екипу су чинили:

- Један геодетски стручњак;
- и два фигуранта.

2.4. Изравање резултата мерења и деформациона анализа у контролној 1Д мрежи

Висине тачака мреже добили смо изравнањем мерења. Изравнање је урађено по методи најмањих квадрата са датумом дефинисаним минималним трагом свих репера. Тежине мерених величина су дефинисане бројем станица у поједином нивелманском влаку: $p_i = \frac{1}{n_i}$

Показатељи тачности оцена 1Д *изравнања су:*

- Стандардна одступања оцена координата σ_H

GMP448N	109.849	109.8449	0.2	1	-4.1	-0.2
GMO024	108.832	108.8357	0.2	1.1	3.7	0.1
1	109.7415	109.7419	0.2	0.8	0.4	0.1
2	110.4796	110.4799	0.2	0.9	0.3	0.1
3	109.7225	109.7228	0.2	0.9	0.3	0.1
4	109.7552	109.7557	0.2	0.7	0.5	0.1
5	110.4644	110.4646	0.2	0.8	0.2	0.1
6	109.9316	109.9324	0.2	0.7	0.8	0.1
7	109.7597	109.76	0.1	0.6	0.3	0.1
8	110.4282	110.4285	0.2	0.7	0.3	0.1
9	109.8135	109.8139	0.1	0.7	0.4	0.1
10	109.6112	109.6115	0.1	0.6	0.3	0.1
11	110.4184	110.4188	0.1	0.7	0.4	0.1
12	109.6594	109.6598	0.1	0.6	0.4	0.1
13	109.7057	109.7059	0.1	0.5	0.2	0.1
14	110.3922	110.3926	0.1	0.6	0.4	0.1
15	109.8327	109.8326	0.1	0.6	-0.1	0.1
16	109.7051	109.7052	0.1	0.5	0.1	0
17	110.3993	110.3995	0.1	0.6	0.2	0
18	109.6786	109.6787	0.1	0.5	0.1	0
19	109.6775	109.6774	0.1	0.5	-0.1	0
20	110.4176	110.4177	0.1	0.6	0.1	0
21	109.8239	109.8237	0.1	0.5	-0.2	0
22	109.5261	109.5261	0.1	0.5	0	0
23	110.4164	110.4165	0.1	0.6	0.1	0
24	109.7194	109.7195	0.1	0.5	0.1	0
25	109.7536	109.7535	0.1	0.6	-0.1	0
26	110.4717	110.4715	0.1	0.6	-0.2	0
27	109.6641	109.6641	0.1	0.5	0	0
28	109.6174	109.6171	0.1	0.6	-0.3	-0.1
29	110.4098	110.4094	0.1	0.7	-0.4	-0.1
30	109.6285	109.628	0.1	0.6	-0.5	-0.1

31	109.6245	109.6239	0.1	0.7	-0.6	-0.1
32	110.3977	110.3973	0.2	0.7	-0.4	-0.1
33	109.6966	109.6963	0.1	0.7	-0.3	-0.1
34	109.8304	109.8299	0.2	0.9	-0.5	-0.2
35	110.4846	110.484	0.2	1	-0.6	-0.2
36	109.8534	109.853	0.2	0.9	-0.4	-0.2
37	109.8338	109.8334	0.2	1	-0.4	-0.2
38	110.4258	110.4255	0.2	1	-0.3	-0.2
39	109.792	109.7915	0.2	0.9	-0.5	-0.2

Након провере изравнатих резултата мерења приступило се анализи слегања тла помоћу програмског пакета *Jag3d.*

3. Садржина елабората геодетских радова

После извршених теренских мерења и обраде резултата мерења *за прву епоху мерења* израдили смо одговарајући елаборат о геодетском 1Д осматрању објекта и кроз резултате изравнања, који су дати кроз прилоге, доказали да је прва епоха реализована са задовољавајућом тачношћу.

Прва епоха изведена је по пројекту док је елаборат о реализацији пројекта геодетског осматрања у нултој епохи мерења израђен је у форми техничког извештаја са одговарајућим прилозима.

Елаборат геодетског осматрања нулте епохе 1Д мреже садржи:

1) Општу документацију;
2) Технички извештај;
3) Прилоге.

Општа документација садржи сва неопходна документа о испуњености услова фирме и стручњака за извођење радова на геодетском осматрању објекта.

У прилозима се налази табеларна и графичка презентација резултата опажања нулте епохе са пратећим подацима, којима се доказује да су мерења извршена у складу са пројектом.

Ови подаци омогућавају да се стекне увид да ли су геодетски радови изведени са задовољавајућом тачношћу.

У техничком извештају о геодетским осматрањима посебно смо описали и дали податке о 1Д мрежи објекта за праћење слегања:

1) Осврт на извршена мерења (контрола извршених мерења; обрада података; тачност извршених мерења и примењене методе за обраду података);
2) Закључак.

Прилози садрже следеће:

1) изравнање резултата мерења;
2) резултати деформационе анализе
3) нивелманска скица

Елаборат садржати фотокопије уверења о еталонирању инструмената и прибора.

4. Закључак

Извршена мерења у потпуности задовољавају пројектом захтевану тачност и њихови резултати могу послужити као апсолутно поуздана основа за утврђивање коначних кота основних и радних репера за **прву** епоху децембар 2024. године.

Датум мреже је дефинисан минималним трагом на све тачке.

Постигнута тачност задовољава тражене информације и мерења могу да се усвоје за утврђивање слегања тла.

5. Нумеричка документација

Прилог 1 – Изравнање резултата мерења у контролној 1Д мрежи

MicroSurvey STAR*NET-ULTIMATE Version 9,1,4,7868
Run Date: Mon Dec 2 2024 10:31:02

Summary of Files Used and Option Settings

Project Folder and Data Files

Project Name 1
Project Folder C:\USERS\NEMNJ\DESKTOP
Data File List 1. 1.dat
2. Nivelanje\135 dna.dat

Project Option Settings

STAR*NET Run Mode : Adjust with Error Propagation
Type of Adjustment : Lev
Project Units : Meters
Input/Output Coordinate Order : North-East
Create Coordinate File : Yes

Instrument Standard Error Settings

Project Default Instrument
Differential Levels : 0.002403 Meters / Km

Number of Differential Level Observations (Meters) = 64

From	To	Elev Diff	StdErr	Length
1	2	0.7381	0.0004	27
2	3	-0.7570	0.0004	27
3	4	0.0330	0.0004	27
4	5	0.7089	0.0004	25
5	6	-0.5321	0.0004	25
6	1	-0.1904	0.0004	27
1	6	0.1904	0.0004	27
6	7	-0.1723	0.0004	27
7	8	0.6685	0.0004	25
8	9	-0.6146	0.0004	25
9	4	-0.0581	0.0004	27
4	9	0.0581	0.0004	27
9	10	-0.2024	0.0004	27
10	11	0.8073	0.0004	24
11	12	-0.7590	0.0004	24
12	7	0.1001	0.0004	27
7	12	-0.1002	0.0004	27
12	13	0.0460	0.0004	27
13	14	0.6867	0.0004	25
14	15	-0.5600	0.0004	25
15	10	-0.2211	0.0004	27

10	15	0.2212	0.0004	27
15	16	-0.1274	0.0004	27
16	17	0.6943	0.0004	23
17	18	-0.7208	0.0004	23
18	13	0.0272	0.0004	27
13	18	-0.0271	0.0004	27
18	19	-0.0013	0.0004	28
19	20	0.7404	0.0004	27
20	21	-0.5939	0.0004	26
21	16	-0.1185	0.0004	27
16	21	0.1186	0.0004	27
21	22	-0.2975	0.0004	27
22	23	0.8905	0.0004	25
23	24	-0.6969	0.0004	25
24	19	-0.0421	0.0004	27
19	24	0.0419	0.0004	27
24	25	0.0340	0.0004	27
25	26	0.7180	0.0004	26
26	27	-0.8075	0.0004	26
27	22	-0.1381	0.0004	27
22	27	0.1380	0.0004	27
27	28	-0.0470	0.0004	27
28	29	0.7924	0.0004	25
29	30	-0.7814	0.0004	25
30	25	0.1253	0.0004	27
25	30	-0.1256	0.0004	27
30	31	-0.0039	0.0004	27
31	32	0.7734	0.0004	24
32	33	-0.7010	0.0004	24
33	28	-0.0791	0.0004	27
28	33	0.0791	0.0004	27
33	34	0.1333	0.0008	100
34	35	0.6543	0.0004	29
35	36	-0.6309	0.0004	28
36	37	-0.0196	0.0004	27
37	38	0.5921	0.0004	24
38	39	-0.6340	0.0004	24
39	34	0.0385	0.0004	27
34	39	-0.0385	0.0004	27
39	GMP448N	0.0529	0.0003	18
GMP448N	36	0.0071	0.0003	20
36	31	-0.2294	0.0008	100
7	GMO024	-0.9244	0.0006	72

Adjustment Statistical Summary
==========

Number of Stations = 41

Number of Observations = 64
Number of Unknowns = 40
Number of Redundant Obs = 24

Observation Level	Count of StdRes	Sum Squares Data	Error Factor
Data	64	9.213	0.620
Total	64	9.213	0.620

Warning: The Chi-Square Test at 5.00% Level Exceeded Lower Bound

Lower/Upper Bounds (0.719/1.281)

Adjusted Observations and Residuals

==========

Adjusted Differential Level Observations (Meters)

From	To	Elev Diff	Residual	StdErr	StdRes	File:Line
1	2	0.7380	-0.0001	0.0004	0.1	2:13
2	3	-0.7571	-0.0001	0.0004	0.1	2:14
3	4	0.0329	-0.0001	0.0004	0.1	2:15
4	5	0.7088	-0.0001	0.0004	0.2	2:16
5	6	-0.5322	-0.0001	0.0004	0.2	2:17
6	1	-0.1905	-0.0000	0.0004	0.1	2:18
1	6	0.1905	0.0000	0.0004	0.0	2:19
6	7	-0.1724	-0.0000	0.0004	0.1	2:20
7	8	0.6685	-0.0000	0.0004	0.1	2:21
8	9	-0.6147	-0.0000	0.0004	0.1	2:22
9	4	-0.0581	0.0000	0.0004	0.0	2:23
4	9	0.0581	0.0001	0.0004	0.1	2:24
9	10	-0.2024	0.0000	0.0004	0.1	2:25
10	11	0.8073	0.0000	0.0004	0.0	2:26
11	12	-0.7589	0.0000	0.0004	0.0	2:27
12	7	0.1002	0.0000	0.0004	0.1	2:28
7	12	-0.1002	0.0000	0.0004	0.0	2:29
12	13	0.0460	-0.0000	0.0004	0.0	2:30
13	14	0.6867	0.0000	0.0004	0.1	2:31
14	15	-0.5599	0.0000	0.0004	0.1	2:32
15	10	-0.2212	-0.0001	0.0004	0.1	2:33
10	15	0.2212	-0.0001	0.0004	0.1	2:34
15	16	-0.1274	0.0000	0.0004	0.1	2:35
16	17	0.6943	0.0000	0.0004	0.1	2:36
17	18	-0.7208	0.0000	0.0004	0.1	2:37
18	13	0.0271	-0.0001	0.0004	0.1	2:38
13	18	-0.0271	-0.0001	0.0004	0.2	2:39
18	19	-0.0013	0.0000	0.0004	0.0	2:40
19	20	0.7403	-0.0001	0.0004	0.3	2:41
20	21	-0.5940	-0.0001	0.0004	0.3	2:42
21	16	-0.1185	-0.0000	0.0004	0.1	2:43
16	21	0.1185	-0.0000	0.0004	0.1	2:44
21	22	-0.2977	-0.0001	0.0004	0.3	2:45
22	23	0.8904	-0.0001	0.0004	0.3	2:46
23	24	-0.6970	-0.0001	0.0004	0.3	2:47
24	19	-0.0421	0.0001	0.0004	0.1	2:48
19	24	0.0421	0.0002	0.0004	0.4	2:49
24	25	0.0340	0.0000	0.0004	0.0	2:50
25	26	0.7180	0.0001	0.0004	0.2	2:51
26	27	-0.8074	0.0001	0.0004	0.2	2:52
27	22	-0.1380	0.0000	0.0004	0.1	2:53
22	27	0.1380	0.0000	0.0004	0.0	2:54
27	28	-0.0470	0.0001	0.0004	0.1	2:55
28	29	0.7923	-0.0001	0.0004	0.3	2:56
29	30	-0.7815	-0.0001	0.0004	0.3	2:57
30	25	0.1255	0.0001	0.0004	0.4	2:58
25	30	-0.1255	0.0001	0.0004	0.2	2:59
30	31	-0.0041	-0.0002	0.0004	0.4	2:60
31	32	0.7734	-0.0000	0.0004	0.1	2:61
32	33	-0.7010	-0.0000	0.0004	0.1	2:62
33	28	-0.0792	-0.0001	0.0004	0.1	2:63
28	33	0.0792	0.0001	0.0004	0.3	2:64
33	34	0.1338	0.0005	0.0008	0.7	2:65
34	35	0.6539	-0.0003	0.0004	0.8	2:66
35	36	-0.6312	-0.0003	0.0004	0.7	2:67
36	37	-0.0194	0.0002	0.0004	0.6	2:68
37	38	0.5923	0.0002	0.0004	0.5	2:69
38	39	-0.6338	0.0002	0.0004	0.5	2:70
39	34	0.0383	-0.0002	0.0004	0.6	2:71

34	39	-0.0383	0.0002	0.0004	0.5	2:72
39	GMP448N	0.0534	0.0004	0.0003	1.4	2:73
GMP448N	36	0.0076	0.0005	0.0003	1.4	2:74
36	31	-0.2289	0.0005	0.0008	0.7	2:75
7	GMO024	-0.9243	0.0000	0.0006	0.0	2:76

Differential Level Loop Check Connection Averages

==========

From	To	Elev Diff	StdErr	File:Line
6	1	-0.1904	0.0003	
Difference:		0.0000	0.0004	2:18
Difference:		-0.0000	0.0004	2:19
9	4	-0.0581	0.0003	
Difference:		-0.0000	0.0004	2:23
Difference:		0.0000	0.0004	2:24
12	7	0.1002	0.0003	
Difference:		-0.0000	0.0004	2:28
Difference:		0.0000	0.0004	2:29
15	10	-0.2212	0.0003	
Difference:		0.0001	0.0004	2:33
Difference:		-0.0001	0.0004	2:34
18	13	0.0271	0.0003	
Difference:		0.0001	0.0004	2:38
Difference:		-0.0001	0.0004	2:39
21	16	-0.1185	0.0003	
Difference:		0.0000	0.0004	2:43
Difference:		-0.0000	0.0004	2:44
24	19	-0.0420	0.0003	
Difference:		-0.0001	0.0004	2:48
Difference:		0.0001	0.0004	2:49
27	22	-0.1380	0.0003	
Difference:		-0.0000	0.0004	2:53
Difference:		0.0000	0.0004	2:54
30	25	0.1255	0.0003	
Difference:		-0.0001	0.0004	2:58
Difference:		0.0001	0.0004	2:59
33	28	-0.0791	0.0003	
Difference:		-0.0000	0.0004	2:63
Difference:		0.0000	0.0004	2:64
39	34	0.0385	0.0003	
Difference:		0.0000	0.0004	2:71
Difference:		-0.0000	0.0004	2:72

Differential Level Loop Check Closures

==========

From	To	Elev Diff	StdErr	Length	File:Line

6	5	0.5321	0.0004	25	2:17
5	4	-0.7089	0.0004	25	2:16
4	3	-0.0330	0.0004	27	2:15
3	2	0.7570	0.0004	27	2:14
2	1	-0.7381	0.0004	27	2:13
1	6	0.1904	0.0003	27	Average

Error of Closure: 0.0003 158
Standard Error: 0.0009
Standardized Error: 0.3832

7	6	0.1723	0.0004	27	2:20
6	5	0.5321	0.0004	25	2:17
5	4	-0.7089	0.0004	25	2:16
4	9	0.0581	0.0003	27	Average
9	8	0.6146	0.0004	25	2:22
8	7	-0.6685	0.0004	25	2:21

Error of Closure: 0.0003 154
Standard Error: 0.0009
Standardized Error: 0.3109

12	7	0.1002	0.0003	27	Average
7	8	0.6685	0.0004	25	2:21
8	9	-0.6146	0.0004	25	2:22
9	10	-0.2024	0.0004	27	2:25
10	11	0.8073	0.0004	24	2:26
11	12	-0.7590	0.0004	24	2:27

Error of Closure: 0.0000 152
Standard Error: 0.0009
Standardized Error: 0.0280

15	10	-0.2212	0.0003	27	Average
10	11	0.8073	0.0004	24	2:26
11	12	-0.7590	0.0004	24	2:27
12	13	0.0460	0.0004	27	2:30
13	14	0.6867	0.0004	25	2:31
14	15	-0.5600	0.0004	25	2:32

Error of Closure: 0.0001 152
Standard Error: 0.0009
Standardized Error: 0.0839

18	13	0.0271	0.0003	27	Average
13	14	0.6867	0.0004	25	2:31
14	15	-0.5600	0.0004	25	2:32
15	16	-0.1274	0.0004	27	2:35
16	17	0.6943	0.0004	23	2:36
17	18	-0.7208	0.0004	23	2:37

Error of Closure: 0.0001 150
Standard Error: 0.0009
Standardized Error: 0.1633

21	16	-0.1185	0.0003	27	Average
16	17	0.6943	0.0004	23	2:36
17	18	-0.7208	0.0004	23	2:37
18	19	-0.0013	0.0004	28	2:40
19	20	0.7404	0.0004	27	2:41
20	21	-0.5939	0.0004	26	2:42

Error of Closure: -0.0001 154
Standard Error: 0.0009
Standardized Error: 0.1388

24	19	-0.0420	0.0003	27	Average
19	20	0.7404	0.0004	27	2:41
20	21	-0.5939	0.0004	26	2:42
21	22	-0.2975	0.0004	27	2:45
22	23	0.8905	0.0004	25	2:46
23	24	-0.6969	0.0004	25	2:47

Error of Closure: -0.0006 157
Standard Error: 0.0009
Standardized Error: 0.6482

27	22	-0.1380	0.0003	27	Average
22	23	0.8905	0.0004	25	2:46
23	24	-0.6969	0.0004	25	2:47
24	25	0.0340	0.0004	27	2:50
25	26	0.7180	0.0004	26	2:51
26	27	-0.8075	0.0004	26	2:52

Error of Closure: -0.0001 156
Standard Error: 0.0009
Standardized Error: 0.0662

30	25	0.1255	0.0003	27	Average
25	26	0.7180	0.0004	26	2:51
26	27	-0.8075	0.0004	26	2:52
27	28	-0.0470	0.0004	27	2:55
28	29	0.7924	0.0004	25	2:56
29	30	-0.7814	0.0004	25	2:57

Error of Closure: 0.0000 156
Standard Error: 0.0009
Standardized Error: 0.0110

33	28	-0.0791	0.0003	27	Average
28	29	0.7924	0.0004	25	2:56
29	30	-0.7814	0.0004	25	2:57
30	31	-0.0039	0.0004	27	2:60
31	32	0.7734	0.0004	24	2:61
32	33	-0.7010	0.0004	24	2:62

Error of Closure: -0.0005 152
Standard Error: 0.0009
Standardized Error: 0.5592

36	31	-0.2294	0.0008	100	2:75
31	32	0.7734	0.0004	24	2:61
32	33	-0.7010	0.0004	24	2:62
33	34	0.1333	0.0008	100	2:65
34	35	0.6543	0.0004	29	2:66
35	36	-0.6309	0.0004	28	2:67

Error of Closure: 0.0004 305
Standard Error: 0.0013
Standardized Error: 0.2864

36	35	0.6309	0.0004	28	2:67
35	34	-0.6543	0.0004	29	2:66
34	39	-0.0385	0.0003	27	Average
39	38	0.6340	0.0004	24	2:70
38	37	-0.5921	0.0004	24	2:69
37	36	0.0196	0.0004	27	2:68

Error of Closure: 0.0002 159
Standard Error: 0.0009
Standardized Error: 0.2073

39	34	0.0385	0.0003	27	Average
34	35	0.6543	0.0004	29	2:66
35	36	-0.6309	0.0004	28	2:67
36	GMP448N	-0.0071	0.0003	20	2:74
GMP448N	39	-0.0529	0.0003	18	2:73

Error of Closure: -0.0018 122
Standard Error: 0.0008
Standardized Error: 2.2239

Elapsed Time = 00:00:00

Java·Applied·Geodesy·3D - Report

Least-Squares Adjustment & Deformation Analysis

Project

JAG3D Version:	v20240220
Name of Project:	
Project Id:	
Customer Id:	
Person in Charge:	nemnj
Date of Calculation:	2024-12-02
Date of Report:	2024-12-02
Kind of network:	free Network (l_0)
Adjustment Type:	Least squares adjustment (l_0-Norm)
Coordinate frame:	Local Cartesian model
Probability Value α:	0.10 %
Test Power (1-β):	80.00 %
Description:	

B-Method (Baarda)

d1	d2	α in %	(1 - β) in %	λ (α,β)	$\log(\beta_{H1,\alpha,\beta})$	q ($F_{d1,d2,1-\alpha}$)
1.00	∞	0.10	80.00	17.07	-6.91	10.83
1.00	23.00	0.36	80.00	17.07	-5.61	10.47
6.49	∞	2.02	80.00	17.07	-3.90	2.43
17.51	∞	8.97	80.00	17.07	-2.41	1.48
24.00	∞	13.14	80.00	17.07	-2.03	1.33
24.00	∞	13.14	80.00	17.07	-2.03	1.33

Test statistics Φ^{-1} w.r.t. the degree of freedom *d1* and *d2*, respectively

Variance Component Estimation

Group name	n_G	r_G	Ω_G	$\hat{\tau}^2_G$	$q\,(F_{r_G,\infty,1-\alpha})$	$\hat{\tau}^2_G \leq q \cdot \bar{\tau}^2_0$	H_0
Total Adjustment	64	24.00	11.42	0.48	1.33	✔	
Levelling	64	24.00	11.42	0.48	1.33	✔	
Levelling σ_A	64	6.49	2.94	0.45	2.43	✔	
Levelling σ_{S_0}	64	17.51	8.48	0.48	1.48	✔	

Variance Component Estimation

Principal component analysis

k	$\lambda(k)$ in mm	$\lambda(k)/trace(Cxx)$ in %
41	0.6	44.66

Principal component analysis

Datum Points: 135 Datum

Point-Id	Code	Height z0 in m	Height z in m	σ_z in mm	a in mm	Δ_z in mm	C_z in mm
GMP448N	**0**	109.8490	109.8449	0.2	1.0	-4.1	-0.2
GMO024	**0**	108.8320	108.8357	0.2	1.1	3.7	0.1
1	**0**	109.7415	109.7419	0.2	0.8	0.4	0.1
2	**0**	110.4796	110.4799	0.2	0.9	0.3	0.1
3	**0**	109.7225	109.7228	0.2	0.9	0.3	0.1
4	**0**	109.7552	109.7557	0.2	0.7	0.5	0.1
5	**0**	110.4644	110.4646	0.2	0.8	0.2	0.1
6	**0**	109.9316	109.9324	0.2	0.7	0.8	0.1
7	**0**	109.7597	109.7600	0.1	0.6	0.3	0.1
8	**0**	110.4282	110.4285	0.2	0.7	0.3	0.1
9	**0**	109.8135	109.8139	0.1	0.7	0.4	0.1
10	**0**	109.6112	109.6115	0.1	0.6	0.3	0.1
11	**0**	110.4184	110.4188	0.1	0.7	0.4	0.1
12	**0**	109.6594	109.6598	0.1	0.6	0.4	0.1
13	**0**	109.7057	109.7059	0.1	0.5	0.2	0.1
14	**0**	110.3922	110.3926	0.1	0.6	0.4	0.1
15	**0**	109.8327	109.8326	0.1	0.6	-0.1	0.1
16	**0**	109.7051	109.7052	0.1	0.5	0.1	0.0
17	**0**	110.3993	110.3995	0.1	0.6	0.2	0.0
18	**0**	109.6786	109.6787	0.1	0.5	0.1	0.0
19	**0**	109.6775	109.6774	0.1	0.5	-0.1	0.0
20	**0**	110.4176	110.4177	0.1	0.6	0.1	0.0
21	**0**	109.8239	109.8237	0.1	0.5	-0.2	0.0
22	**0**	109.5261	109.5261	0.1	0.5	-0.0	-0.0
23	**0**	110.4164	110.4165	0.1	0.6	0.1	-0.0
24	**0**	109.7194	109.7195	0.1	0.5	0.1	-0.0
25	**0**	109.7536	109.7535	0.1	0.6	-0.1	-0.0
26	**0**	110.4717	110.4715	0.1	0.6	-0.2	-0.0
27	**0**	109.6641	109.6641	0.1	0.5	0.0	-0.0
28	**0**	109.6174	109.6171	0.1	0.6	-0.3	-0.1
29	**0**	110.4098	110.4094	0.1	0.7	-0.4	-0.1
30	**0**	109.6285	109.6280	0.1	0.6	-0.5	-0.1
31	**0**	109.6245	109.6239	0.1	0.7	-0.6	-0.1
32	**0**	110.3977	110.3973	0.2	0.7	-0.4	-0.1
33	**0**	109.6966	109.6963	0.1	0.7	-0.3	-0.1
34	**0**	109.8304	109.8299	0.2	0.9	-0.5	-0.2
35	**0**	110.4846	110.4840	0.2	1.0	-0.6	-0.2
36	**0**	109.8534	109.8530	0.2	0.9	-0.4	-0.2
37	**0**	109.8338	109.8334	0.2	1.0	-0.4	-0.2
38	**0**	110.4258	110.4255	0.2	1.0	-0.3	-0.2
39	**0**	109.7920	109.7915	0.2	0.9	-0.5	-0.2
						-4.1	

Point Group: 135 Datum

Levelling: 135 points

Station-Id	Target-Id	ϑ_i in gon	ϑ_t in gon	$\delta\vartheta\vartheta$ in cc	$\sigma\vartheta$ in cc	δs_i in m	σ in mm	r in %	$\bar{x}$ in mm	$\bar{\tau}$ in mm	EP in mm	EP SP in mm	$\bar{\tau}(1)$ in mm	$\bar{\tau}(\lambda)$ in mm	Ω	$\log(p_{prio})$	$\log(p_{post})$	τ_{prio}	τ_{post}	$\tau \leq q \cdot \bar{\tau}_0$	H_0
1	**2**	0.0000	0.0000	0.7380	0.2	0.7380	0.1	21.77	-0.0	0.2	0.2	0.2	0.4	1.7	0.07	-0.55	-0.84	0.31	0.64	✔	
2	**3**	0.0000	0.0000	-0.7570	0.2	-0.7571	0.1	21.77	-0.0	0.2	0.2	0.2	0.4	1.7	0.07	-0.55	-0.84	0.31	0.64	✔	
3	**4**	0.0000	0.0000	0.0330	0.2	0.0329	0.1	21.77	-0.0	0.2	0.2	0.2	0.4	1.7	0.07	-0.55	-0.84	0.31	0.64	✔	
4	**5**	0.0000	0.0000	0.7069	0.2	0.7068	0.1	27.98	-0.1	0.3	0.2	0.3	0.4	1.5	0.22	-0.98	-1.58	0.78	1.69	✔	
5	**6**	0.0000	0.0000	-0.5321	0.2	-0.5322	0.1	27.98	-0.1	0.3	0.2	0.3	0.4	1.5	0.22	-0.98	-1.58	0.78	1.69	✔	
6	**1**	0.0000	0.0000	-0.1904	0.2	-0.1905	0.1	55.44	-0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	1.1	0.03	-0.21	-0.31	0.06	0.12	✔	
1	**6**	0.0000	0.0000	0.1904	0.2	0.1905	0.1	55.44	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.3	-1.1	0.01	-0.09	-0.12	0.01	0.02	✔	
6	**7**	0.0000	0.0000	-0.1723	0.2	-0.1724	0.1	26.19	-0.0	0.2	0.1	0.2	0.4	1.6	0.05	-0.41	-0.61	0.19	0.38	✔	
7	**8**	0.0000	0.0000	0.6685	0.2	0.6685	0.1	29.41	-0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	1.4	0.01	-0.18	-0.25	0.04	0.08	✔	
8	**9**	0.0000	0.0000	-0.6146	0.2	-0.6147	0.1	29.41	-0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	1.4	0.01	-0.18	-0.25	0.04	0.08	✔	
9	**4**	0.0000	0.0000	-0.0581	0.2	-0.0581	0.1	56.55	0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.3	-1.1	0.00	-0.05	-0.07	0.00	0.01	✔	
4	**9**	0.0000	0.0000	0.0581	0.2	0.0581	0.1	56.55	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.3	-1.1	0.07	-0.32	-0.48	0.13	0.26	✔	
9	**10**	0.0000	0.0000	-0.2024	0.2	-0.2024	0.1	27.09	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.4	-1.5	0.01	-0.18	-0.26	0.04	0.09	✔	
10	**11**	0.0000	0.0000	0.8073	0.2	0.8073	0.1	29.27	0.0	-0.1	-0.0	0.1	-0.3	-1.4	0.01	-0.15	-0.22	0.03	0.06	✔	
11	**12**	0.0000	0.0000	-0.7590	0.2	-0.7589	0.1	29.27	0.0	-0.1	-0.0	0.1	-0.3	-1.4	0.01	-0.15	-0.22	0.03	0.06	✔	
12	**7**	0.0000	0.0000	0.1001	0.2	0.1002	0.1	56.77	0.0	-0.1	-0.0	0.1	-0.3	-1.1	0.03	-0.21	-0.31	0.06	0.12	✔	
7	**12**	0.0000	0.0000	-0.1002	0.2	-0.1002	0.1	56.77	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.3	-1.1	0.01	-0.08	-0.12	0.01	0.02	✔	
12	**13**	0.0000	0.0000	0.0460	0.2	0.0460	0.1	27.26	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-1.1	0.00	-0.01	-0.02	0.00	0.00	✔	
13	**14**	0.0000	0.0000	0.6867	0.2	0.6867	0.1	29.76	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.3	-1.4	0.01	-0.18	-0.26	0.04	0.09	✔	
14	**15**	0.0000	0.0000	-0.5600	0.2	-0.5599	0.1	29.76	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.3	-1.4	0.01	-0.18	-0.26	0.04	0.09	✔	
15	**10**	0.0000	0.0000	-0.2211	0.2	-0.2212	0.1	56.81	-0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	1.1	0.08	-0.36	-0.53	0.15	0.30	✔	
10	**15**	0.0000	0.0000	0.2212	0.2	0.2212	0.1	56.81	-0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	1.1	0.08	-0.34	-0.51	0.14	0.28	✔	
15	**16**	0.0000	0.0000	-0.1274	0.2	-0.1274	0.1	27.34	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.4	-1.5	0.02	-0.21	-0.31	0.06	0.12	✔	
16	**17**	0.0000	0.0000	0.6943	0.2	0.6943	0.1	28.83	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.3	-1.4	0.03	-0.31	-0.45	0.11	0.23	✔	
17	**18**	0.0000	0.0000	-0.7208	0.2	-0.7208	0.1	28.83	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.3	-1.4	0.03	-0.31	-0.45	0.11	0.23	✔	
18	**13**	0.0000	0.0000	0.0272	0.2	0.0271	0.1	56.84	-0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	1.1	0.08	-0.33	-0.50	0.13	0.27	✔	
13	**18**	0.0000	0.0000	-0.0271	0.2	-0.0271	0.1	56.84	-0.1	0.1	0.1	0.3	1.1	0.16	-0.52	-0.79	0.28	0.59	✔	
18	**19**	0.0000	0.0000	-0.0013	0.2	-0.0013	0.1	27.72	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.4	-1.5	0.00	-0.11	-0.15	0.02	0.03	✔	
19	**20**	0.0000	0.0000	0.7404	0.2	0.7403	0.1	30.59	-0.1	0.3	0.2	0.4	0.3	1.4	0.31	-1.15	-1.89	1.00	2.21	✔	
20	**21**	0.0000	0.0000	-0.5939	0.2	-0.5940	0.1	29.77	-0.1	0.3	0.2	0.4	0.3	1.4	0.30	-1.15	-1.89	1.00	2.21	✔	
21	**16**	0.0000	0.0000	-0.1185	0.2	-0.1185	0.1	56.75	-0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	1.1	0.02	-0.17	-0.25	0.04	0.08	✔	
16	**21**	0.0000	0.0000	0.1186	0.2	0.1185	0.1	56.75	-0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	1.1	0.05	-0.25	-0.37	0.08	0.16	✔	
21	**22**	0.0000	0.0000	-0.2975	0.2	-0.2977	0.1	26.90	-0.1	0.4	0.3	0.5	0.4	1.5	0.38	-1.46	-2.48	1.42	3.27	✔	
22	**23**	0.0000	0.0000	0.8905	0.2	0.8904	0.1	29.54	-0.1	0.3	0.2	0.4	0.3	1.4	0.29	-1.14	-1.87	0.98	2.17	✔	
23	**24**	0.0000	0.0000	-0.6969	0.2	-0.6970	0.1	29.54	-0.1	0.3	0.2	0.4	0.3	1.4	0.29	-1.14	-1.87	0.98	2.17	✔	
24	**19**	0.0000	0.0000	-0.0421	0.2	-0.0421	0.1	56.72	0.1	-0.1	-0.0	0.1	-0.3	-1.1	0.07	-0.32	-0.47	0.12	0.25	✔	
19	**24**	0.0000	0.0000	0.0419	0.2	0.0421	0.1	56.72	0.2	-0.3	-0.1	0.2	-0.3	-1.1	0.78	-1.42	-2.41	1.37	3.13	✔	
24	**25**	0.0000	0.0000	0.0340	0.2	0.0340	0.1	26.88	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.4	-1.5	0.00	-0.10	-0.15	0.02	0.03	✔	
25	**26**	0.0000	0.0000	0.7180	0.2	0.7180	0.1	29.86	0.1	-0.2	-0.1	0.2	-0.3	-1.4	0.11	-0.59	-0.92	0.35	0.74	✔	
26	**27**	0.0000	0.0000	-0.8075	0.2	-0.8074	0.1	29.86	0.1	-0.2	-0.1	0.2	-0.3	-1.4	0.11	-0.59	-0.92	0.35	0.74	✔	
27	**22**	0.0000	0.0000	-0.1381	0.2	-0.1380	0.1	56.72	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.3	-1.1	0.02	-0.15	-0.22	0.03	0.07	✔	
22	**27**	0.0000	0.0000	0.1380	0.2	0.1380	0.1	56.72	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.3	-1.1	0.01	-0.08	-0.11	0.01	0.02	✔	
27	**28**	0.0000	0.0000	-0.0470	0.2	-0.0470	0.1	26.56	0.1	-0.2	-0.1	0.2	-0.4	-1.5	0.07	-0.50	-0.76	0.27	0.55	✔	
28	**29**	0.0000	0.0000	0.7924	0.2	0.7923	0.1	28.87	-0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	1.4	0.26	-1.07	-1.74	0.89	1.96	✔	
29	**30**	0.0000	0.0000	-0.7814	0.2	-0.7815	0.1	28.87	-0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	1.4	0.26	-1.07	-1.74	0.89	1.96	✔	
30	**25**	0.0000	0.0000	0.1253	0.2	0.1255	0.1	56.64	0.1	-0.3	-0.1	0.2	-0.3	-1.1	0.57	-1.16	-1.91	1.01	2.24	✔	
25	**30**	0.0000	0.0000	-0.1256	0.2	-0.1255	0.1	56.64	0.1	-0.2	-0.1	0.1	-0.3	-1.1	0.24	-0.66	-1.03	0.43	0.89	✔	
30	**31**	0.0000	0.0000	-0.0039	0.2	-0.0040	0.1	24.72	-0.2	0.6	0.5	0.7	0.4	1.6	0.62	-2.18	-4.02	2.52	6.50	✔	
31	**32**	0.0000	0.0000	0.7734	0.2	0.7734	0.1	24.71	-0.0	0.2	0.1	0.2	0.4	1.5	0.05	-0.43	-0.64	0.20	0.41	✔	
32	**33**	0.0000	0.0000	-0.7010	0.2	-0.7010	0.1	24.71	-0.0	0.2	0.1	0.2	0.4	1.5	0.05	-0.43	-0.64	0.20	0.41	✔	
33	**28**	0.0000	0.0000	-0.0791	0.2	-0.0792	0.1	56.18	-0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	1.1	0.06	-0.29	-0.42	0.10	0.21	✔	
28	**33**	0.0000	0.0000	0.0790	0.2	0.0792	0.1	56.18	0.1	-0.2	-0.1	0.2	-0.3	-1.1	0.30	-0.77	-1.21	0.54	1.14	✔	
33	**34**	0.0000	0.0000	0.1333	0.3	0.1336	0.2	37.65	0.3	-0.8	-0.5	0.5	-0.5	-2.2	0.92	-2.13	-3.91	2.44	6.25	✔	
34	**35**	0.0000	0.0000	0.6542	0.2	0.6542	0.1	31.71	-0.1	0.3	0.2	0.3	0.4	1.4	0.20	-0.84	-1.34	0.62	1.33	✔	
35	**36**	0.0000	0.0000	-0.6309	0.2	-0.6310	0.1	30.90	-0.1	0.3	0.2	0.3	0.4	1.4	0.19	-0.84	-1.34	0.62	1.33	✔	
36	**37**	0.0000	0.0000	-0.0196	0.2	-0.0196	0.1	26.76	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.4	-1.5	0.02	-0.25	-0.36	0.08	0.16	✔	
37	**38**	0.0000	0.0000	0.5920	0.2	0.5921	0.1	24.59	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.4	-1.5	0.02	-0.25	-0.36	0.08	0.16	✔	
38	**39**	0.0000	0.0000	-0.6340	0.2	-0.6340	0.1	24.59	0.0	-0.1	-0.1	0.1	-0.4	-1.5	0.02	-0.25	-0.36	0.08	0.16	✔	
39	**34**	0.0000	0.0000	0.0385	0.2	0.0384	0.1	58.03	-0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	1.0	0.36	-0.84	-1.33	0.62	1.31	✔	
34	**39**	0.0000	0.0000	-0.0385	0.2	-0.0384	0.1	58.03	0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.3	-1.0	0.15	-0.50	-0.76	0.26	0.54	✔	
39	**GMP448N**	0.0000	0.0000	0.0533	0.2	0.0535	0.1	27.26	0.2	-0.6	-0.4	0.7	-0.3	-1.3	0.97	-2.83	-5.60	3.56	10.43	✔	
GMP448N	**36**	0.0000	0.0000	0.0079	0.2	0.0081	0.1	29.21	0.2	-0.6	-0.4	0.7	-0.3	-1.3	1.04	-2.83	-5.60	3.56	10.43	✔	
36	**31**	0.0000	0.0000	-0.2294	0.3	-0.2291	0.2	37.65	0.3	-0.8	-0.5	0.5	-0.5	-2.2	0.92	-2.13	-3.91	2.44	6.25	✔	
7	**GMO024**	0.0000	0.0000	-0.9244	0.3	-0.9243	0.2	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	✔	
								24.00	0.3	-0.8					11.42					

Observation Group: 135 points (A-priori: σ_A = 0.1 mm, σ_0 = 1.0 mm)

Reliability of terrestrial observations

Observation Group	Observation Type	Station-Id	Target-Id	$\bar{r}_{min}$ in %	$\bar{\tau}_{avg}$ in m
135 points	**Levelling**	1	2	21.77	38.10
135 points	**Levelling**	2	3	21.77	38.10
135 points	**Levelling**	3	4	21.77	38.10

Summary of redundancy r

Observation Group	Observation Type	Station-Id	Target-Id	$\log(p_{prio,max})$	$\log(p_{prio,avg})$
135 points	**Levelling**	39	GMP448N	-2.83	-0.63

Summary of (a-priori) probability value p

Observation Group	Observation Type	Station-Id	Target-Id	EP_{max} in mm	EP_{avg} in mm
135 points	**Levelling**	33	34	-0.5	0.1

Summary of influence on point position due to an undetected gross-error EP

Levelling



Distribution of redundancy r (Mean interval: [r] 30.00 % ≤ r ≤ 70.00 %])



Distribution of (a-priori) probability value p-value (Mean interval: [p-value] 1.00 % ≤ p-value ≤ 5.00 %])

Distribution of influence on point position due to an undetected gross-error EP (Mean interval: [EP] 1.0 mm ≤ EP ≤ 5.0 mm])

- Подударност основне геодетске мреже и радних репера

Број тачке	H0 (нулта)	H1 (прва)	Вектор померања (мм) H1-H0
GMP448N	109.8452	109.8449	-0.3
GMO024	108.8358	108.8357	-0.1
1	109.7415	109.7419	0.4
2	110.4796	110.4799	0.3
3	109.7225	109.7228	0.3
4	109.7552	109.7557	0.5
5	110.4644	110.4646	0.2
6	109.9316	109.9324	0.8
7	109.7597	109.7600	0.3
8	110.4282	110.4285	0.3
9	109.8135	109.8139	0.4
10	109.6112	109.6115	0.3
11	110.4184	110.4188	0.4
12	109.6594	109.6598	0.4
13	109.7057	109.7059	0.2
14	110.3922	110.3926	0.4
15	109.8327	109.8326	-0.1
16	109.7051	109.7052	0.1
17	110.3993	110.3995	0.2
18	109.6786	109.6787	0.1
19	109.6775	109.6774	-0.1
20	110.4176	110.4177	0.1
21	109.8239	109.8237	-0.2
22	109.5261	109.5261	0.0
23	110.4164	110.4165	0.1
24	109.7194	109.7195	0.1
25	109.7535	109.7535	0.0
26	110.4717	110.4715	-0.2
27	109.6641	109.6641	0.0
28	109.6174	109.6171	-0.3
29	110.4098	110.4094	-0.4
30	109.6285	109.6280	-0.5
31	109.6245	109.6239	-0.6
32	110.3977	110.3973	-0.4

33	109.6966	109.6963	-0.3
34	109.8304	109.8299	-0.5
35	110.4846	110.4840	-0.6
36	109.8534	109.8530	-0.4
37	109.8338	109.8334	-0.4
38	110.4258	110.4255	-0.3
39	109.7920	109.7915	-0.5

- Координате радних репера

1	5067450.879	7395299.349
2	5067450.802	7395304.880
3	5067450.894	7395309.830
4	5067425.891	7395310.077
5	5067425.814	7395304.788
6	5067425.781	7395299.645
7	5067400.897	7395310.190
8	5067400.793	7395305.148
9	5067400.826	7395299.407
10	5067375.861	7395310.571
11	5067375.942	7395305.003
12	5067375.888	7395299.246
13	5067350.820	7395310.301
14	5067350.803	7395305.128
15	5067350.682	7395299.684
16	5067325.968	7395310.602
17	5067325.879	7395305.204
18	5067325.814	7395299.481
19	5067300.863	7395310.651
20	5067300.743	7395305.499
21	5067300.846	7395299.452
22	5067275.934	7395311.380
23	5067275.924	7395305.481
24	5067275.796	7395300.062
25	5067250.940	7395310.815
26	5067250.779	7395305.652
27	5067250.895	7395300.189
28	5067225.881	7395311.221
29	5067225.855	7395305.781
30	5067225.807	7395299.988
31	5067200.977	7395311.365
32	5067200.991	7395305.935
33	5067200.798	7395300.413
34	5067101.008	7395311.928
35	5067100.912	7395306.353
36	5067100.842	7395301.285
37	5067075.984	7395311.602
38	5067075.979	7395306.693
39	5067075.882	7395301.289

6. Графичка документација

Прилог 2 - Нивелманска мерења



ЛЕГЕНДА:

GMP610	ПОСТОЈЕЋИ СТУБОВИ ГЕОДЕТСКЕ МРЕЖЕ
A1	РЕПЕРИ НА ОБЈЕКТУ
	МЕРЕЊА ПРЕЦИЗНИМ НИВЕЛМАНОМ

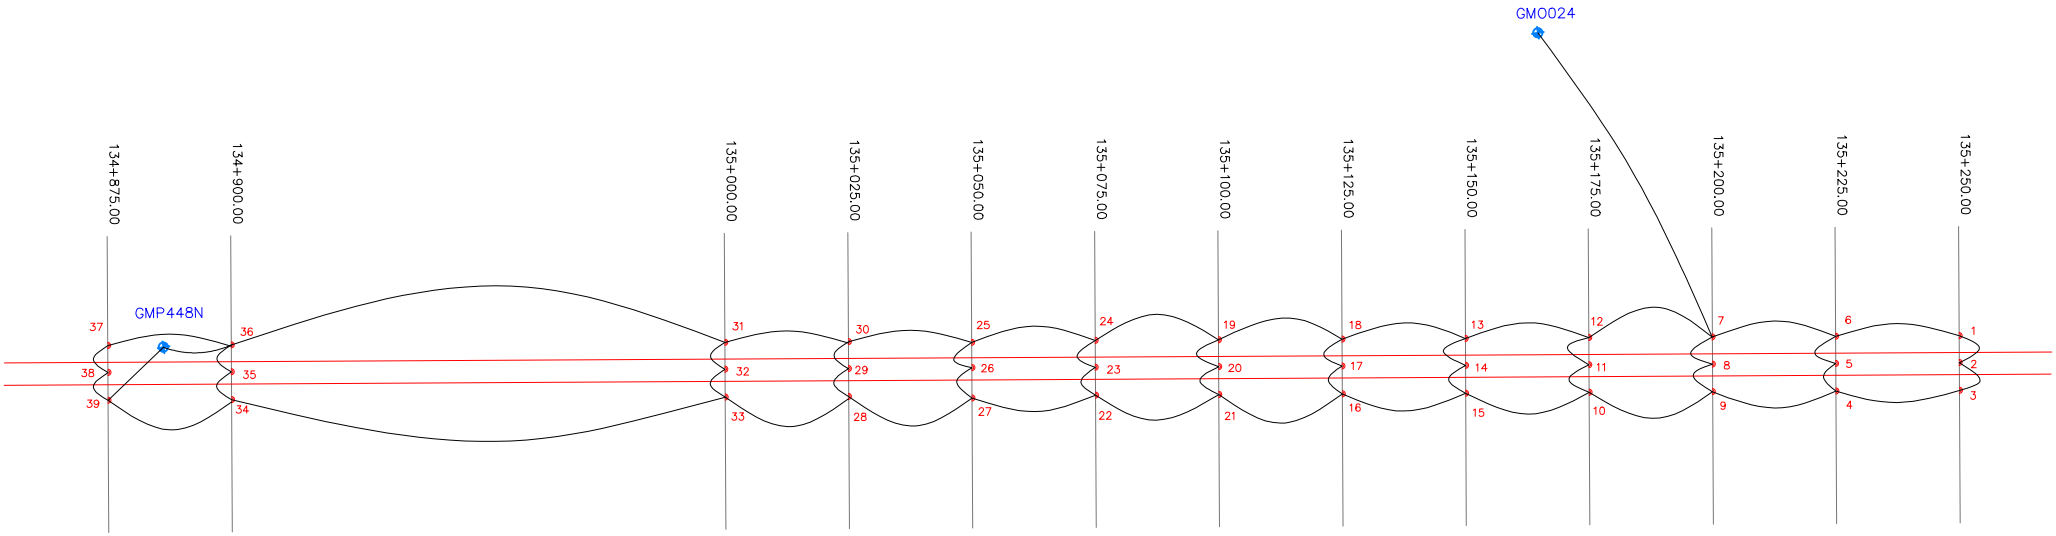

Извођачка организација:
Геодетске услуге Ашанин
ул. Војвођански булевар 32/38
26000 Панчево
Tel:+381 61 29 66 216
bojan.ashanin@gmail.com

Инвеститор:
"Инфраструктура Железнице Србије" а.д.
Немањина 6/4,
11 000 Београд

Наручилац:
"Shandong Luqiao group CO. LTD
ogranak Beograd"

Објекат:
Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Одговорни извођач:
Драгомир Стојићевић, дипл.инж.геодез.
Број лиценце:
471 J292 15

Потпис:

Техничка документације:
ПЗИ - ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

Радни Тим:
Бојан Ашанин, мастер инж. геодезије

Ознака и назив дела документа:
ПРОЈЕКАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА

Ознака і Назив свеске:
PS1.1-1022 Пројекат 1Д мреже стационаже на км од 134+875 до 133+250

БОЈАН АШАНИН ПР
ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ
АШАНИН
ПАНЧЕВО

Назив цртежа:	Датум:	Размера:	Број пројекта:	*Цртеж бр:*
План нивелманских мерења у 1D мрежи	Децембар 2024.		PS1.1-1022	1
